

Prüfbericht Nr.: 240425-042
Funktionsprüfung

**Bestimmung der Versickerung von Niederschlagswasser auf
versickerungsfähigen Verkehrsflächen**

Auftragsgegenstand: Prüfung und Beurteilung der Versickerungsfähigkeit von Niederschlagswasser auf einer mit dem **Linearpflaster Antik/ Prescara 8 cm (glatt, Kante gealtert)** und einem **Fugenmaterial Basaltsplitt 1-3 mm** verlegte Fläche.

Auftraggeber: Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co.KG
Deching 3
94133 Röhrnbach

1. Aufgabenstellung

Die REMEI & BPB GmbH & Co.KG wurde vom Auftraggeber mit der Prüfung und Beurteilung der Versickerungsfähigkeit von Niederschlagswasser auf einer mit dem Pflastersortiment, Linearpflaster Antik/Prescara verlegten Fläche beauftragt. Die Fugenbreite wurde mit ca. 5 mm eingestellt und mit einem Basaltsplitt 1-3 mm verfüllt.

2. Anforderung an versickerungsfähige Verkehrsflächen

Die Eingangsgröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit versickerungsfähiger Pflastersysteme ist der auf die befestigte Oberfläche auftreffende Niederschlag. Dabei wird die Bemessungsregenspende $r_{10(0,2)}$ zugrunde gelegt. Sie bezeichnet einen statistisch einmal alle fünf Jahre auftretenden Regen bei einer Regendauer von 10 Minuten. Diese maßgebende Bemessungsregenspende beträgt grundsätzlich mindestens 270 l/(s*ha) . Das jeweilige versickerungsfähige Pflastersystem muss in der Lage sein, die maßgebliche Regenspende dauerhaft und vollständig zu versickern.

Um dies zu gewährleisten, muss der Oberbau, zu dem auch die versickerungsfähige Pflasterdecke gehört, und der Untergrund eine entsprechend hohe Wasserdurchlässigkeit aufweisen. Im theoretischen Zustand eines wassergesättigten Befestigungsaufbaus würde man den erforderlichen Durchlässigkeitsbeiwert der Bemessungsregenspende gleichsetzen können. Da sich ein Befestigungsaufbau in der Örtlichkeit aber stets im ungesättigten Zustand befindet, gilt nach empirischen Beobachtungen $k_{f,u} \approx k_f/2$. Das bedeutet, dass der für den Befestigungsaufbau in der Praxis erforderliche Durchlässigkeitsbeiwert doppelt so hoch sein muss. Somit ergibt sich für einen versickerungsfähigen Befestigungsaufbau eine erforderliche Wasserdurchlässigkeit von $k_f \geq 5,4 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$, um die maßgebende Bemessungsregenspende von $r = 270 \text{ l/(s*ha)}$ vollständig aufzunehmen.

3. Abmessungen und Kennwerte

Bei dem Pflastersteinsortiment handelt es sich um gefügedichte Pflastersteine mit seitlich angeordneten Abstandhaltern. Über die Fugen wird das anfallende Niederschlagswasser in die Bettung und weiter in die Tragschicht abgeleitet. Von dort versickert es in Richtung des Planums oder wird über eine Drainage abgeleitet.

4. Fugenmaterial

Als Fugenmaterial wurde ein Basaltsplitt der Korngruppe 1-3 mm verwendet. Die verwendete Gesteinskörnung muss filterstabil auf die weiteren Schichten des Oberbaus abgestimmt werden.

5. Versuchsaufbau

Es wurde eine Versuchsfläche von $0,90 \times 0,70 \text{ m}$ hergestellt, unter der eine Auffangwanne mit seitlichem Auslauf installiert wurde. Auf einer Fläche von $0,63 \text{ m}^2$ wurde eine Pflasterbettung aus einem Basaltsplitt der Korngröße 1-3 mm, in einer Dicke von 4 cm eingebaut und verdichtet.

Anschließend wurden die Pflastersteine ohne Gefälle darauf verlegt. Für die Prüfung der Versickerungsleistung wurde dann ein Stahlring mit einem Durchmesser von 56 cm, mittels Abdichtband, auf die Versuchsfläche geklebt.

Die Verfüllung der Fugen, bis Oberkante Pflaster erfolgte mit einem Basaltsplitt 1-3 mm.

Der Einfluss weiterer Schichten des Ober- und Unterbaus war nicht Gegenstand der Untersuchung.

6. Ablauf des Versuchs

Die abgedichtete Versuchsfläche wurde gleichmäßig mithilfe eines Tropf-Infiltrimeter mit einem Modellniederschlag konstanter Intensität für 30 min beregnet. Die Intensität wurde so eingestellt, dass sich innerhalb der Versuchsfläche ein gleichbleibender Wasserfilm von 15 mm einstellen konnte. Die der

Beregnungseinheit zugeführte Wassermenge wurde mit Hilfe eines Durchflussmessers in Abhängigkeit der Zeit aufgezeichnet.

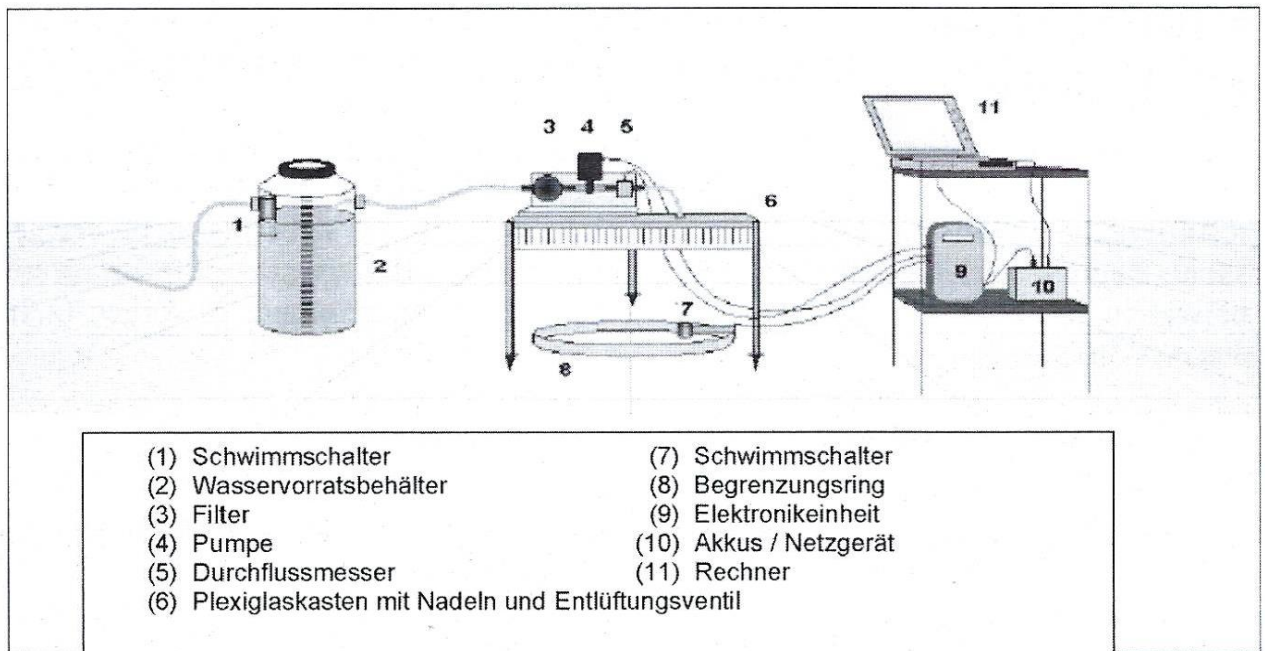


Abb.1: Versuchsablauf der Infiltrationsmessung aus TP Gestein-StB

7. Ergebnisse des Versuchs

Es wurde eine Einzelmessung durchgeführt und als aufnehmbare Regenspende in $l/(s \cdot ha)$ dargestellt. Der Endwert $i_{(30)}$ nach 30 min Messung entspricht in etwa der Versickerungsintensität im wassergesättigten Zustand und kann als Durchlässigkeitsbeiwert k_f in (m/s) interpretiert werden. Der Wert der Infiltrationsrate $i_{(10)}$ nach 10 Minuten Messung wird als potentielle aufnehmbare Regenspende $r_{(10)}$ in $l/(s \cdot ha)$ ausgelegt.

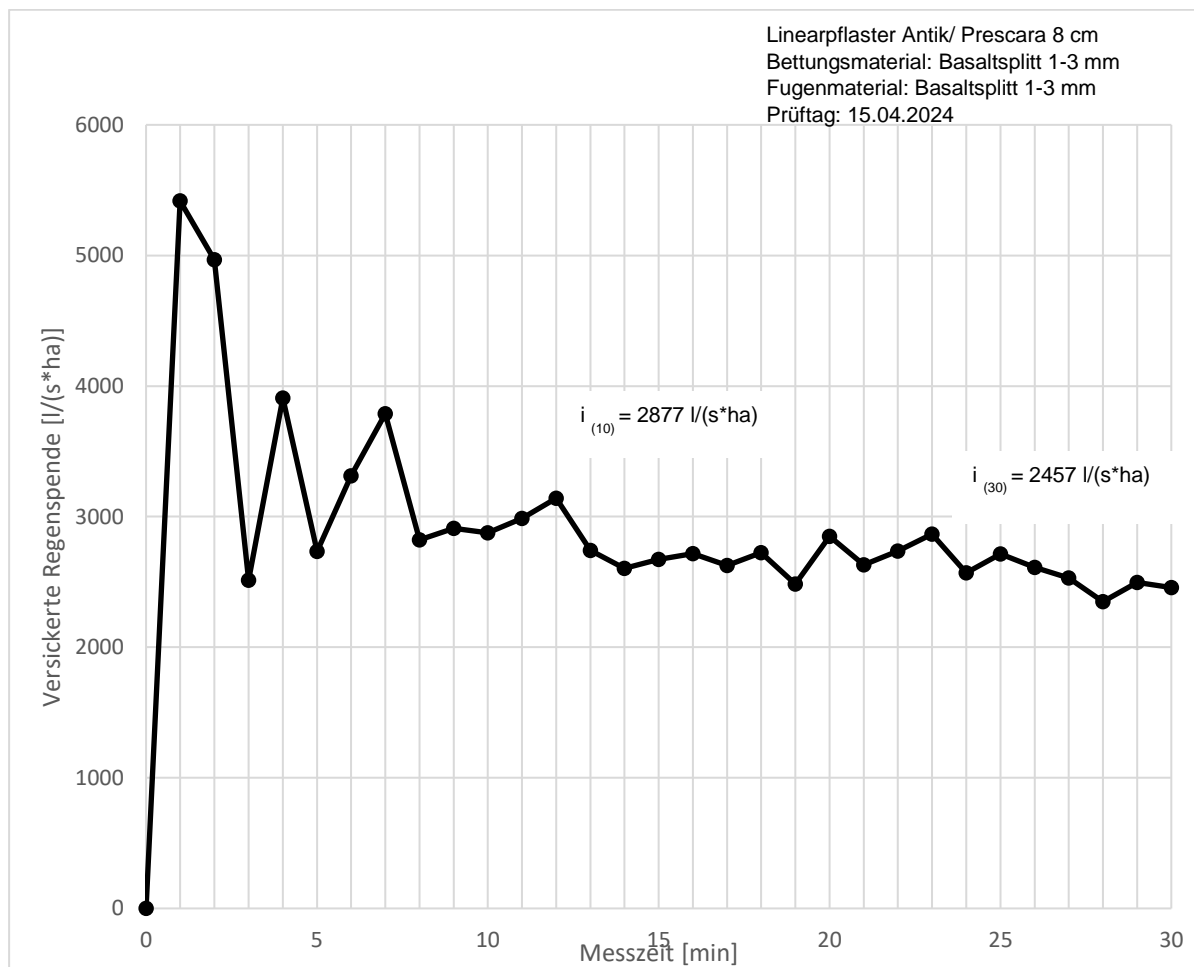


Abb. 2: Ergebnisverlauf der Infiltrationsmessung

8. Schlussbemerkung

Das abgeprüfte Pflastersteinsortiment, Linearpflaster Antik/ Prescara 8 cm, erreicht bei einer gefällelosen Verlegung mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm unter Verwendung eines Basaltsplitt 1-3 mm als Fugenfüllung, eine versickerbare Regenpende von **2877 l/(s*ha)**.

Somit wird die geforderte Bemessungsregenpende von 270 l/(s*ha) nach dem Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen, Ausgabe 2013, nach dem hier beschriebenen Aufbau erfüllt.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf dem im Bericht angegebenen Prüfgegenstand. Eine Vervielfältigung in gekürzter Form, auszugsweise oder zu Werbezwecken ist ohne die schriftliche Zustimmung der REMEI & BPB GmbH & Co.KG nicht gestattet.

Blomberg, 25.04.2024

REMEI & BPB GmbH & Co.KG
S. Husemann
Svenja Husemann
Prüfstellenleiterin
